INFORME DE AVANCE DE OBRA

OBRA DE DEMOSTRACIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD Y DRENAJE DEL SECTOR DE PRUEBA

Ubicación: Distrito de ejemplo, Provincia de ejemplo, Perú

Fecha de corte: 20/10/2026

Modalidad: Por contrata

Línea base: V1


Inicio: 01/10/2026

Término: 30/10/2026

EJERCICIO CON DATOS SIMULADOS


FÍSICO CONFIRMADO	FINANCIERO	VALORIZADO	BASE DIRECTA
9.29%	**7.09%**	**S/ 2,630.00**	**S/ 37,100.00**
Plan: 66.67%	Plan: 66.67%	1 partes confirmados	Pagos: S/ 0.00

Curva S física

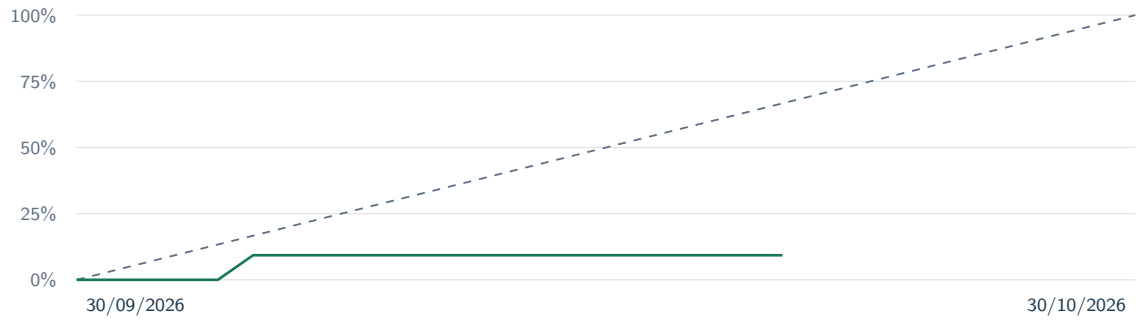

- - Programa — Confirmado

Curva S financiera

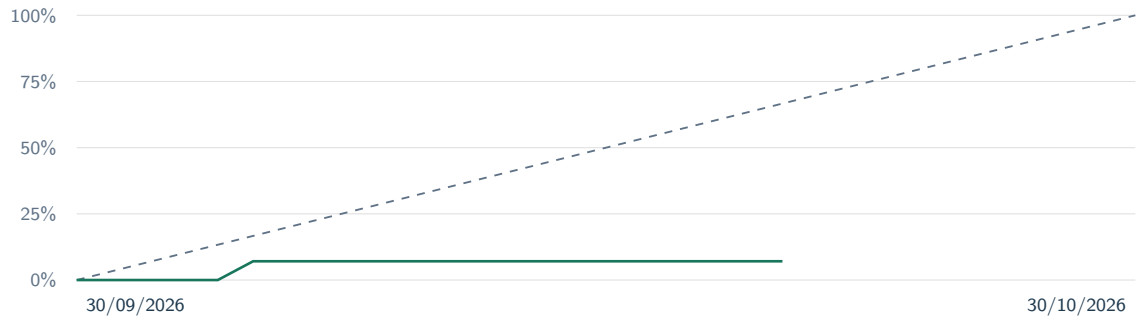

- - Programa — Confirmado

METRADOS Y VALORIZACIÓN AL CORTE

Ítem	Descripción	Unid.	Contratado	Ejecutado	Avance	Valorizado
01.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	m^3	100.00	100.00	100.00%	S/ 2,000.00
01.02	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL	m^3	100.00	30.00	30.00%	S/ 630.00
01.03	CONCRETO EN OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCIÓN DE TALUDES	m^3	100.00	0.00	0.00%	S/ 0.00
01.04	REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODADURA	m^3	100.00	0.00	0.00%	S/ 0.00
01.05	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	m^3	100.00	0.00	0.00%	S/ 0.00
01.06	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL	m^3	100.00	0.00	0.00%	S/ 0.00
01.07	CONCRETO EN OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCIÓN DE TALUDES	m^3	100.00	0.00	0.00%	S/ 0.00
01.08	REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODADURA	m^3	100.00	0.00	0.00%	S/ 0.00
01.09	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	m^3	100.00	0.00	0.00%	S/ 0.00
01.10	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL	m^3	100.00	0.00	0.00%	S/ 0.00
01.11	CONCRETO EN OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCIÓN DE TALUDES	m^3	100.00	0.00	0.00%	S/ 0.00
01.12	REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODADURA	m^3	100.00	0.00	0.00%	S/ 0.00
01.13	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	m^3	100.00	0.00	0.00%	S/ 0.00
01.14	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL	m^3	100.00	0.00	0.00%	S/ 0.00

Valorizado total: S/ 2,630.00

Base de cálculo: únicamente reportes confirmados hasta el corte. Avance financiero = metrado valorizado / presupuesto directo. Los pagos se registran por separado. No incluye IGV, gastos generales ni otros conceptos. El programa distribuye cada partida por las horas laborables de su actividad vinculada.

Residente de ejemplo
Residente de obra

Supervisor de ejemplo
Supervisor de obra

Espacios para firma manuscrita. Los nombres provienen de la ficha y no constituyen firmas digitales.

TRAZABILIDAD DEL DOCUMENTO

Código de formato: FO-01
Obra: ejemplo-v9
Línea base: V1
Corte: 20/10/2026
Presupuesto original: Sin identificador
Programa original: Sin identificador

Reportes utilizados

Fecha	ID de reporte	Responsable	Estado
05/10/2026	ejemplo-parte-001	Asistente de ejemplo	Confirmado
